PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Gobierno del Perú

Nombre del Proyecto:

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" - **CIU N° 2425378**

Ing. Fernando Gonzales Aguayo

Director Ejecutivo

04 de Octubre del 2024

ANTECEDENTES

- La bocatoma la Peña es una estructura de concreto armado, consta de un barraje fijo y barraje móvil. las compuertas radiales accionadas por un motor eléctrico.
- Compuertas de 15 m de largo x 3.78 m de alto, Las compuertas metálicas han colapsado por lo que amerita el cambio total de compuertas radiales; así como el sistema de izaje, eléctrico y mecánico.
- La cuarta compuerta que se encuentra ubicada casi al centro del cauce del rio, está colapsada del lado derecho en posición de los brazos a la hoja de la compuerta, los refuerzos de la hoja cedieron por la fuerza del rio y posible impacto con flotantes, de esta forma es que ella se desplaza hacia atrás quedando fuera del recorrido del blindaje lateral y doblando el brazo que se encuentra de lado izquierdo de la compuerta.
- La estructura refuerzo de la hoja de las compuertas, se encuentran en completo estado de óxido, en algunos casos estas se encuentran desprendidas de la hoja de la compuerta, otras se encuentran dobladas o rotas por el esfuerzo al que están expuestas.

DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES -PEBPT

- Ubicación : - distritos Corrales, La Cruz y San Jacinto - provincia Tumbes - departamento Tumbes.
- Modalidad : Ejecución Presupuestaria Directa- Contrata.
- Sistema : Precios Unitarios.
- Fuente Financiamiento : Recursos Determinados.
- Convocatoria : CONTRATACIÓN DIRECTA N°0006-2024-MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE
- Monto de Contrato : S/ 25’574,778.42; inc. IGV
- Plazo de Ejecución : 180 Días calendario
- Contrato : N° 0001/2024-MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OA
- Fecha Firma Contrato : 29 de mayo del 2024.

EJECUTOR DE OBRA : INVERSIONES OBERTI SRL .

- Representante Legal : Luis Oberti García Alberca
- Residente de Obra : Víctor Edwin Escalante Fachin CIP 85546
- Carta Fiel Cumplimiento : Carta Fianza GOO N°15411-0625-2024-000; Fecha de emisión 29/5/2024; Monto S/ 2’557,477.84
- Adelanto Directo : Carta Fianza GOO N° 15412-0258-2024-000; Fecha de emisión 30/5/2024; Monto S/ 2’557,477.84 Factura N° E001- 769; Fecha de Abono 03/6/2024.
- Adelanto Materiales : Carta Fianza GOO N° 15413-0200-2024-000; Fecha de Emisión 11/6/2024; Monto S/ 5’114,955.68 Factura N° E001- 773; Fecha de Abono 17/6/2024 Entrega de Terreno : 30 de mayo de 2024.
- Inicio del Plazo de obra : 10 de junio de 2024.
- Fin de plazo de obra : 06 de diciembre de 2024.

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

DATOS GENERALES

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

SUPERVISIÓN DE OBRA : CONSORCIO SUPERVISOR LA PEÑA.

- Representante común : Jarol Kevin Neyra Ponce.
- Monto de Contrato : S/ 1’210,056.96 inc. IGV
- Contrato : N° 0002/2024- MINAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OA.
- Fecha Firma Contrato : 05 de junio de 2024.
- Jefe de Supervisión : Cesar Francisco Ferreyra Rojas CIP 118831
- Inicio Plazo Superv. : 10 de junio de 2024
- Fin Plazo Superv. : 06 de diciembre de 2024.

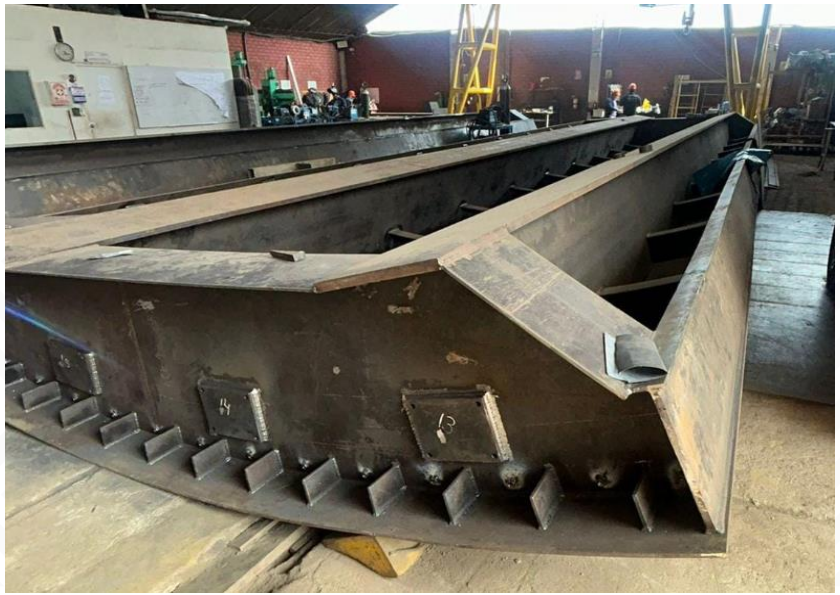

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

OBJETIVOS

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Objetivo General

El objetivo principal es lograr que “Los agricultores de la margen izquierda del rio tumbes, acceden al servicio de agua para riego con el fin de lograr el incremento de la producción agrícola, al disponer de una infraestructura hidráulica adecuada (rehabilitación de la Bocatoma la Peña y Canal de conducción en el primer kilómetro), y por consiguiente el incremento del nivel socioeconómico de los beneficiarios directos

Objetivos Específicos

- Rehabilitar el sistema de compuertas deslizantes y radiales de la bocatoma la peña, sistema electromecánico e izaje, sistema eléctrico de media y baja tensión, iluminación general y seguridad
- Rehabilitar el primer tramo del canal de conducción averiado por el fenómeno del niño costero.
- Desarrollo de 04 Cursos de Capacitación en operación y manteamiento de la infraestructura

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

METAS FISICAS

El expediente técnico de saldo de obra considera como metas físicas:

1. El revestimiento de la caja del canal de conducción hasta la progresiva 1+050 Km.
2. El cambio del sistema de compuertas radiales y deslizantes.
3. Cambio del sistema de accionamiento, sistema de eléctrico en media y baja tensión, sistema mecánico y eléctrico.

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del proyecto son los agricultores de la comisión de regantes sector hidráulico margen izquierda del Rio Tumbes, agrupado en la organización de usuarios de riego del distrito de Corrales y San Jacinto.

Población Beneficiaria.

La población beneficiaria directa corresponde a **1,935 usuarios de riego** debidamente empadronados que hacen una población total de 9,520 habitantes.

Áreas Beneficiadas.

El proyecto se va beneficiar aproximadamente **6,000 hectáreas**, 5,500 hectáreas de cultivos de arroz y 500 hectáreas de cultivos permanentes (banano); cuyas parcelas se ubican en los distritos de San Jacinto, Corrales y La Cruz, de la provincia y departamento de Tumbes. Esta extensión agrícola es altamente significativa en la región Tumbes, del orden del 40% del área total en actual desarrollo.

COSTO DEL PROYECTO

El valor referencial de la obra con precios vigentes al mes de agosto del año 2023, asciende a la suma de **S/ 25,655,937.19** (Veinticinco Millones seiscientos cincuenta y cinco mil, novecientos treinta y siete con 19/100 Soles), incluye gastos generales, utilidad del contratista, así como los impuestos de Ley (IGV). Ver tabla adjunta.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO		
DESCRIPCION	UND	COSTO
COSTO DIRECTO	S/.	18,875,220.07
GASTOS GENERALES (8.411797%)	S/.	1,357,081.97
UTILIDAD DEL CONTRATISTA (8%)	S/.	1,510,017.61
SUB TOTAL	S/.	21,742,319.65
IGV (18%)	S/.	3,913,617.54
VALOR REFERENCIAL	S/.	25,655,937.19
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/.	291,071.60
COSTO DE AFECTACION DE TERRENO (CANAL ALTERNO)	S/.	60,000.00
COSTO DE SUPERVISION DE LA OBRA	S/.	1,210,056.96
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/.	27,217,065.75

Así mismo el costo total del proyecto incluido el costo de elaboración del Expediente Técnico definitivo, Supervisión de obra y liquidación asciende a la suma total de **S/ 27,217,065.75** (Veintisiete Millones doscientos diecisiete mil, sesenta y cinco con 75/100 Soles), soles, con precios vigentes al mes de agosto del año 2023.

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

AVANCE FISICO

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

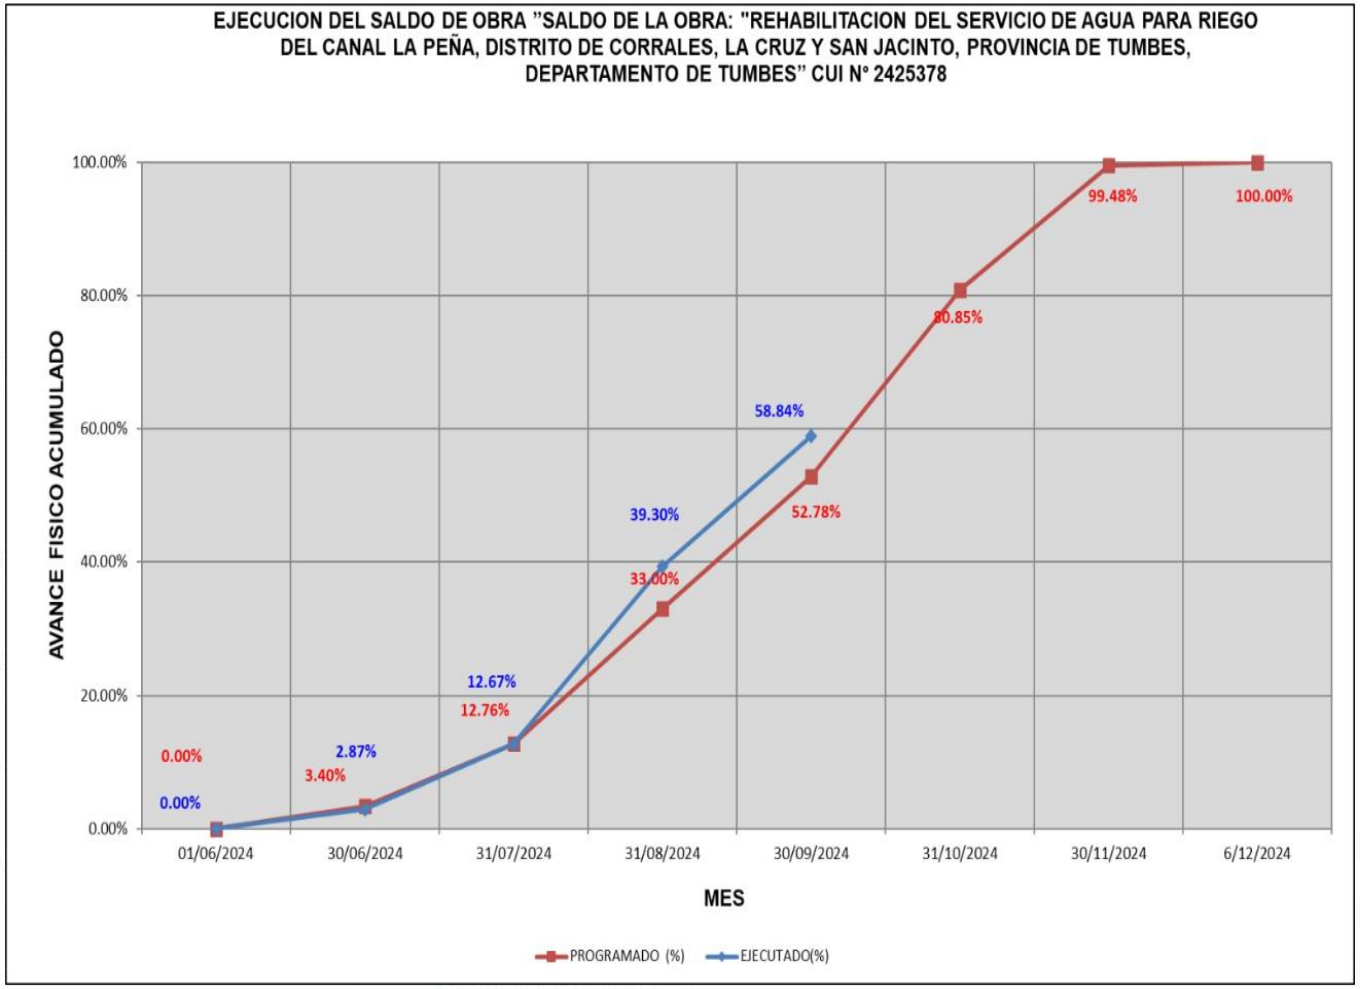

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS			
	MONTOS (INCL IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.
Jun-24	868,401.46	868,401.46	3.40%	3.40%
Jul-24	2,389,681.48	3,258,082.94	9.36%	12.76%
Ago-24	5,167,950.43	8,426,033.37	20.24%	33.00%
Set-24	5,050,282.91	13,476,316.28	19.78%	52.78%
Oct-24	7,169,074.08	20,645,390.36	28.08%	80.85%
Nov-24	4,756,681.41	25,402,071.77	18.63%	99.48%
Dic-24	133,239.41	25,535,311.18	0.52%	100.00%
Σ =	13,476,316.28			

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			
	MONTOS (INCL IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.	PARCIAL S/.	ACUMULADO S/.
Jun-24	731,636.82	731,636.82	2.87%	2.87%
Jul-24	2,502,614.74	3,234,251.56	9.80%	12.67%
Ago-24	6,800,444.71	10,034,696.27	26.63%	39.30%
Set-24	4,991,466.45	15,026,162.72	19.55%	58.84%
Σ =	15,026,162.72			

10,034,696.27

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

AVANCE FINANCIERO – EJECUCIÓN DE OBRA

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

MONTO DEL CONTRATO	25,574,778.42

CERTIFICADO	25,715,939.00

ADELANTO DIRECTO	2,557,477.84
ADELANTO DE MATERIALES	5,114,955.68

PAGOS DE VALORIZACIONES		
VALORIZACION Nº 01	SIAF 0803	658,473.13
VALORIZACION Nº 02	SIAF 0803	1,997,598.75
VALORIZACION Nº 03	SIAF 0803	4,452,956.08
SUB TOTAL		7,109,027.96

TOTAL	14,781,461.48

% DE EJECUCION	57.80

ADELANTOS	MONTO	AMORTIZADO	SALDO
ADELANTO DIRECTO	2,557,477.84	1,003,469.42	1,554,008.42
ADELANTO DE MATERIALES	5,114,955.68	1,922,198.69	3,192,756.99
TOTAL	**7,672,433.52**	**2,925,668.11**	**4,746,765.41**

7,109,027.96
2,925,668.11
10,034,696.07

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

AVANCE FINANCIERO – SUPERVISIÓN DE OBRA

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

MONTO DEL CONTRATO	1,210,056.96

CERTIFICADO	1,210,056.96

PAGOS DE VALORIZACIONES		
VALORIZACION Nº 01	SIAF 01188	135,060.91
VALORIZACION Nº 02	SIAF 01388	199,375.63
SUB TOTAL		334,436.54

TOTAL	**334,436.54**

% DE EJECUCION	**27.64**

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

SITUACION LEGAL

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

A la fecha nos encontramos con los siguientes procesos pendientes de resolver:

a) Proceso de amparo signado en el expediente judicial N.° 043-2024-0-2601-JR-CI-01. (pendiente de resolver con vista de la causa para el 08 de agosto del 2024). (**reprogramado)**.
b) Medida cautelar signado en el expediente judicial N.° 043-2024-39-2601-JR-CI-01. (**Con resolución a favor del PEBPT)**.
c) Solicitud de arbitraje iniciado por CONSORCIO FENIX en el Centro de Arbitraje PROJUSTICIA SOLUCION DE CONTROVERSIAS, por la controversia como producto de la nulidad declarada mediante Resolución Directoral Nº. 0074/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE del 15 de mayo del 2024. **(Aun sin instalar).**
d) Solicitud de arbitraje iniciado por el PEBPT en el Centro de Arbitraje CENPERCO, por la controversia como producto de la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo de ley. **(Arbitraje instalado y en trámite).**
e) Aplicación de sanción según la Resolución Directoral Nº. 0074/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE del 15 de mayo del 2024 ante el Tribunal del OSCE. **(En trámite y pendiente de resolver).**

Existía una medida de ejecución forzada del juzgado civil para el día 03 de octubre del 2024 a favor del CONSORCIO FENIX, la misma que ha quedado sin materializar debido a la medida cautelar signado en el expediente judicial N.° 043-2024-39-2601-JR-CI-01

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

SITUACION LEGAL

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

A la fecha han transcurrido aproximadamente 4 meses de ejecución sin paralización alguna y por el momento con una medida cautelar a favor del PEBPT contenida en la resolución N.° 8 del 16 de setiembre del 2024 - EXPEDIENTE N° 00043-2024-39-2601-SP-CI-01, que resuelve literalmente lo siguiente:

- (1ro) Declarar **FUNDADA EN PARTE** la oposición formulada por el Consorcio Fénix contra la solicitud de medida cautelar innovativa postulada por Procuradora Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en representación del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, en consecuencia **IMPROCEDENTE** la solicitud cautelar innovativa para a ordenar al Consorcio FENIX a abstenerse de solicitar la ejecución de la Orden Arbitral Cautelar suspendida en cualquier otro órgano del fuero judicial y para que se ordene a cualquier órgano jurisdiccional o arbitral abstenerse o suspender cualquier ejecución de la Orden Arbitral Cautelar N° 01 de fecha 30 de mayo de 2024; así como para impedir que órganos arbitrales en general puedan actuar según sus atribuciones y su personal responsabilidad respecto a la referida orden arbitral, siempre que lo hagan respetando los límites que les impone la Constitución y las Leyes vigentes.

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

SITUACION LEGAL

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

A la fecha han transcurrido aproximadamente 4 meses de ejecución sin paralización alguna y por el momento con una medida cautelar a favor del PEBPT contenida en la resolución N.° 8 del 16 de setiembre del 2024 - EXPEDIENTE N° 00043-2024-39-2601-SP-CI-01, que resuelve literalmente lo siguiente:

- (2do) **INFUNDADA** la oposición del Consorcio Fénix respecto a lo demás que contiene; en consecuencia **FUNDADA** la petición de medida cautelar innovativa formulada por la Procuradora Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en representación del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, sobre **suspensión de la orden arbitral; en consecuencia, de cuenta costo y riesgo de la entidad solicitante SUSPENDASE** los efectos jurídicos de la denominada Orden Arbitral N° 01 de fecha 30 de mayo de 2024, de folios 358 a 381, dictada en el Expediente Arbitral de Emergencia N° 001-2024-CARDPROJUSTICIA, hasta que se resuelva definitivamente el proceso de amparo N° 00043-2024-0-2601-SP-CI-01 que se tramita en esta Superior Sala Civil.

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

PANEL FOTOGRAFICO: COMPUERTAS Y CANAL- LA PEÑA

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

MUCHAS GRACIAS
